



Projet cofinancé par  
l'Union européenne



coopération  
allemande

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

# CO-FINANCEMENT UNION EUROPÉENNE – BMZ « ATTRIBUTION DES BOURSES POUR LA FORMATION DES CADRES SUPÉRIEURS (RIFFEAC) ET SOUTIEN AUX ÉCOLES RÉGIONALES, APPUI AU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA GOUVERNANCE FORESTIÈRE »

POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS SOUS-RÉGIONALES  
(ERAIFT & EFG)

JOURNÉE DES PROGRAMMES REGIONAUX DU BASSIN DU CONGO  
DANS LE CADRE DU PFBC : 8 DECEMBRE 2020

PROGRAMME GESTION DURABLE DES FORÊTS DANS LE BASSIN DU CONGO  
PROJET D'APPUI À LA COMMISSION DES FORÊTS D'AFRIQUE CENTRALE (COMIFAC)



Projet cofinancé par  
l'Union européenne



# PLAN DE LA PRESENTATION

---

- I. Rappel du contexte
- II. Résultats attendus
- III. Paysage des acteurs associés et partenariats
- IV. Principaux résultats atteints
- V. Etat de mise en œuvre des activités (sur la base du cadre logique GIZ-UE)
- VI. Difficultés rencontrées
- VII. Perspectives pour l'année 2021

# I - RAPPEL DU CONTEXTE

---

- Dans le cadre du Programme d'appui à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles (ECOFAC VI), l'Union Européenne (UE) et la Coopération allemande-(GIZ) ont lancé un projet de bourses de formation dans certaines écoles du Réseau des institutions de formation forestière et environnementale en Afrique centrale (RIFFEAC) depuis 2017. L'EFG et l'ERAIFT ;
- Ainsi dans le cadre de ce projet et en adéquation avec la composante 2 relative à un appui sous régional, seuls les résultats 4 et 5 du Document d'Action sont ciblés, à savoir :
  - Résultat 4. Les structures de gestion des AP et leur staff sont renforcés ;
  - Résultat 5. Les expériences et connaissances sont échangées et capitalisées au niveau territorial, national et régional.

## II – RÉSULTATS ATTENDUS

---

### Résultats attendus:

1. Jusqu'à 242 allocations pour la formation d'un maximum 118 personnes aux institutions de l'ERAIFT, l'EFG ou autres institutions de formation partenaires sont attribuées ;
2. Les capacités de l'ERAIFT et de l'EFG sont renforcées à travers l'acquisition de 6 véhicules, la construction d'un mur et un bâtiment pour l'ERAIFT et l'achat de matériels et équipements pour l'EFG ;
3. Un mécanisme de financement durable des bourses et d'infrastructures est élaboré ;
4. Au maximum 8 réunions des Groupes de Travail Gouvernance Forestière de la COMIFAC, Biodiversité d'Afrique centrale, du Sous-Groupes de Travail Aires Protégées et Faune Sauvage et de Concertation entre les institutions membres du RIFFEAC sont tenues.

## III – PAYSAGE DES ACTEURS ASSOCIÉS ET PARTENARIATS

1. Union Européenne
2. GIZ: Programme d'appui à la COMIFAC
3. ECOFAC VI
4. Groupe de Travail sur la Gouvernance Forestière (GTGF) de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC)
5. ERAIFT, RD Congo
6. EFG, Cameroun
7. RIFFEAC



**Partenaires  
institutionnels**



**Bénéficiaires**




Exécuté par **giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**PTF**

## IV - PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS

I. Renforcement des conditions cadres à travers la préparation de la mobilité vers les institutions régionales. Dès janvier 2021: 18 apprenants de l'ERAIFT (RDC) pour l'EFG (Cameroun); 6 apprenants de l'ERAIFT pour l'USTM (Gabon)

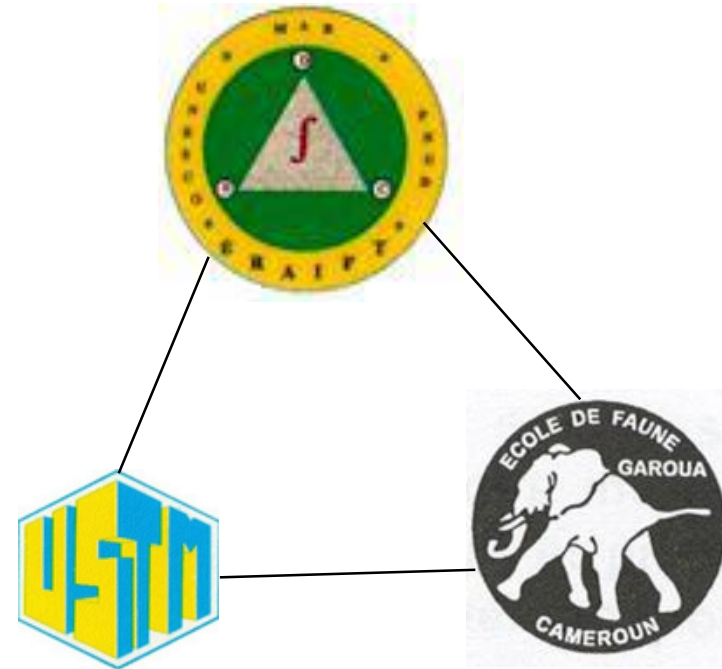

## IV - PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS (SUITE)

### 2. Depuis 2019: **78** allocations niveau Master et **48** allocation niveau Techniciens

#### ERAIFT (Master)

Année universitaire	Nbre d'allocations	Nbre d'étudiants 1ère année	Nbre d'étudiants 2ième année
2017-2018	40	40	0
2018-2019	40	0	40
2019-2020	39	39	0
2020 -2021	23	0	23
<b>Total</b>	<b>142</b>	<b>79</b>	<b>63</b>

#### EFG (Master)

Année universitaire	Nbre d'allocations	Nbre d'étudiants 1ère année	Nbre d'étudiants 2ième année
2018-2019	0	0	
2019-2020	0	0	0
2020-2021	16	0	16
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

#### EFG (Technicien)

Année universitaire	Nbre d'allocations	Nbre d'étudiants 1ère année	Nbre d'étudiants 2ième année
2017-2018	0	0	
2018-2019	0	0	
2019-2020	20	18	2
2020-2021	28	10	18
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>28</b>	<b>20</b>

**Sur 40 étudiants sortis de la 1<sup>ière</sup> promotion Master à ERAIFT (Gestion des Aires Protégées et Techniques d'Aménagement Forestier), 18 sont déjà intégrés dans un organisme de gestion des Aires Protégées!**

## IV - PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS (SUITE)

### 3. 3 véhicules livrés à l'ERAIFT



*Renforcement de l'ERAIFT en équipement roulant  
(06/11/2019)*

### 3 véhicules livrés à l'EFG



*Remise solennelle des véhicules à l'EFG  
(28/08/2020)*



## V – ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS

ACTIVITES PRINCIPALES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE (43% environ de mise en œuvre)	Taux d'exécution 2020
Elaboration signature et contrat EFG et ERAIFT	Contrats signés avec ERAIFT et EFG (mais 2019)	100%
Comité de Pilotage (0/3)		0%
Attribution allocation formation EFG/ ERAIFT	206 allocations (tous niveaux et filières confondus depuis 2007 sur un total prévisionnel de 242	85%
Acquisition véhicules EFG/ ERAIFT	Véhicules transmis aux bénéficiaires	100%
Construction d'un mûr de protection (ERAIFT), des logements et salle informatique (EFG)	Autorisation pour construction accordée, début des travaux éminent	25%
Acquisition matériel EFG (Matériel de Camping et de communication)	Achat effectué, processus de livraison en cours	40%
Appui aux réunions de groupe de travail (GTGF)	Mise en œuvre reportée pour 2021	0%
Accompagnement EFG/ERAIFT	...à la mise sur pied d'un dispositif de suivi des insertions/réinsertion (ERAIFT), appui à la lutte anti COVID 19 (EFG), cours en ligne...	40%
Mécanisme de financement durable	Activité planifiée pour 2021	0%

## VI – DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

---

1. Elaboration des conventions de subventions locales avec possibilités de remboursement des frais engagés, ce qui a entraîné des contraintes administratives tels que la nécessité de demande de dérogation dans l'élaboration des conventions de contrats de financements
2. L'EFG, ne pouvant octroyer les bourses rétroactivement, a décidé d'avoir une rentrée scolaire en Septembre 2019 avec 18 étudiants boursiers au lieu de 6 étudiants boursiers chaque année
3. Le processus de recrutement de l'Expert en charge de la Gouvernance forestière n'est pas encore achevé au niveau de la COMIFAC et la pandémie COVID 19 n'a pas permis la tenue des réunions en présentiel
4. L'absence pour l'EFG d'une ligne dans le budget pour les frais de gestion du projet qui devraient permettre de prendre en compte certaines dépenses à l'instar des envois DHL, des frais bancaires, etc.
5. Difficile mobilité des étudiants et formateurs de l'ERAIFT vers l'EFG pour le semestre III consacré aux cours de spécialisation
6. Lenteurs (administratives et dues au COVID19) dans le déclenchement des activités de construction à l'ERAIFT et à l'EFG

## VI – PERSPECTIVES POUR L'ANNÉE 2021

---

1. Finalisation du processus de livraison des équipements (communication, Camping...) à l'EFG
2. Lancement des activités de construction à l'ERAIFT et l'EFG
3. Elaboration d'un mécanisme de financement durable des bourses
4. Accompagnement effectif de réunions sur la Gouvernance forestière
5. Extension des appuis aux réunions de Groupe de travail Biodiversité, Sous-groupe de travail aire protégée et faune sauvage, RIFFEAC



Projet cofinancé par  
l'Union européenne



coopération  
allemande  
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

---

# MERCI POUR VOTRE ATTENTION
